

上海市青浦区实施乡村振兴战略工作领导小组办公室文件

青乡村振兴办〔2022〕5号

上海市青浦区实施乡村振兴战略工作 领导小组办公室关于加快推进现代农业有机肥 配套中心项目建设的函

青浦现代农业园区：

2020年10月市农业农村委下达《关于青浦区2020年都市现代农业发展专项项目计划（第二批）的批复》（沪农委〔2020〕338号）文件，对现代农业有机肥配套中心项目下达了计划批复。按照文件要求，项目须在8个月内完成招投标，20个月内完成项目建设，24个月内完成项目验收。项目建设单位为华茂有机农业发展有限公司，并被列入2022年市对区乡村振兴考核第44项重点任务，根据市级要求，倒排时间节点，总体目标为5月底完工，9月完成终验。

3月7日，区农业农村委会同你单位至项目基地实地检查。结合现场实际踏勘结果，目前项目仍未竣工，已出现滞后情况（总体形象进度67%）。项目场地工程配电站外接线及变压器安装未

完成；生物质肥料设施钢结构未进场未开工，彩钢板已进场未安装；连栋温室建设顶膜未安装；设备采购工作未见有实质性进展。

请你单位切实承担属地责任，督促项目法人单位尽快完成土建及设备采购、安装、调试等工作。并同步开展审价审计工作，确保项目能及时完成验收。

特此函告。

附件：建设项目现场照片

上海市青浦区实施乡村振兴
战略工作领导小组办公室
2022年3月14日

附件：




配电站外接线及变压器安装未完成



连栋温室顶膜未安装



设备采购及安装未见有实质性进展

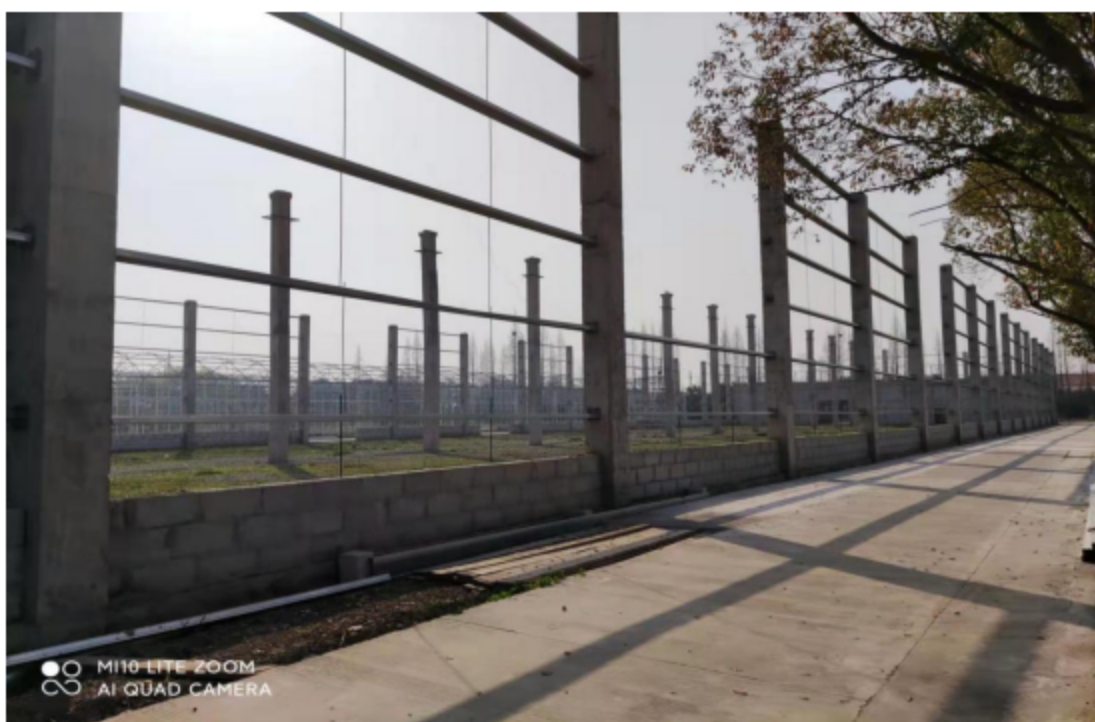

彩钢板未安装，钢结构未进场未开工

青浦区农业农村委员会办公室

2022 年 3 月 14 日印发
